



# **Vantaggi e svantaggi delle possibili strutture organizzative**

A cura di : LEOPOLDO LAMA

## ESERCITAZIONE

### **Vantaggi e svantaggi delle possibili strutture organizzative**

Descriviamo le caratteristiche più significative di quattro tipiche soluzioni organizzative adottabili per la gestione di un “PROGETTO” importante (parleremo successivamente della situazione multiprogetti):

- 1. Organizzazione centralizzata (progetto puro)**
- 2. Organizzazione funzionale (progetto a purezza dominante)**
- 3. Organizzazione a matrice**
- 4. Task force**


Ognuna di queste forme, in relazione alle problematiche strettamente gestionali presenta vantaggi e svantaggi: tuttavia nella maggior parte dei casi non è la loro considerazione a determinare la scelta tra l’una o l’altra forma. La scelta è infatti spesso obbligata in relazione alle caratteristiche del progetto e della struttura organizzativa generale dell'azienda.

Ciò non toglie che conoscere vantaggi e svantaggi di ognuna delle quattro soluzioni sia una cosa importante. Infatti questa conoscenza consente al P.M. di avere in evidenza quelli che sono i “punti di forza” (da sfruttare) e quelli che sono i “punti di debolezza” (da controllare) della forma adottata.

**Provate allora ad indicare quelli che a vostro giudizio, rappresentano i “vantaggi” e gli “svantaggi” di ciascuna di queste quattro soluzioni, in relazione alle problematiche di gestione di un progetto.**

## 1) Organizzazione centralizzata (progetto puro)

Il Project Manager ha piena autorità gerarchica e di linea sopra tutte le risorse necessarie per completare i compiti

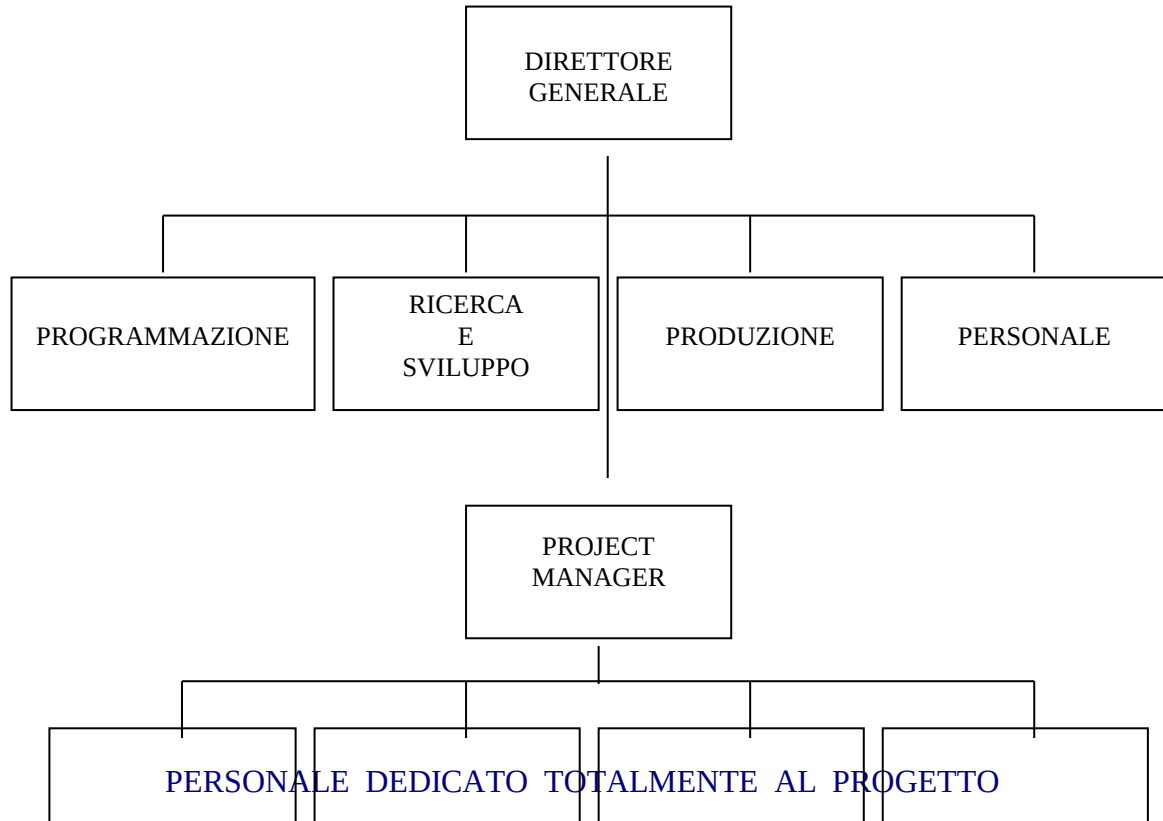

....È il caso che può verificarsi più facilmente per progetti che si collocano fisicamente all'esterno dell'unità operativa.....

### Caratteristiche

- Tradizionale struttura a piramide del personale
- Unica persona (P.M.) responsabile della pianificazione, del controllo, direzione ed avanzamento di tutte le attività del progetto
- Può essere strutturato per tipo di lavoro da realizzare
- Articolata su unità di:
  - ♦ Pianificazione
  - ♦ Progettazione
  - ♦ Realizzazione
  - ♦ Controllo
  - ♦ Amministrativa, ecc...

## 2) Organizzazione funzionale (progetto a purezza dominante)

Quando la parte predominante delle risorse necessarie per la realizzazione di un progetto risiede in un'unica "area funzionale", si può assegnare la posizione di "project manager" al responsabile dell'area funzionale

...Che opera in modo analogo al caso precedente, incorporando temporaneamente nella propria area risorse specialistiche necessarie...abituamente non da lui dipendenti....

Esempio:

Un progetto di ricerca che coinvolga, per lungo tempo, molte specializzazioni e competenze predominanti, affidato full-time ad un gruppo di persone normalmente operanti nell'area ricerca, alle dipendenze del responsabile dell'area. Il progetto richiederà però qualche apporto anche da altre aree funzionali: ufficio tecnico, produzione, marketing, ecc..

### Caratteristiche

- L'area capofila incorpora, temporaneamente, risorse specialistiche da altre aree funzionali
- Le risorse vengono assegnate sulla base dell'occorrenza e della specializzazione
- Ci possono essere o no piccole unità di progettazione
- Il dirigente funzionale, quale Project Manager, ha la responsabilità di:
  - ♦ Definire le esigenze
  - ♦ Programmare il carico di lavoro
  - ♦ Definire le priorità
  - ♦ Provvedere ai mezzi necessari
  - ♦ Acquisire e gestire le risorse
  - ♦ Attenersi alle procedure e politiche dell'azienda
  - ♦ Determinare le date significative dello sviluppo
  - ♦ Realizzare il progetto
  - ♦ Documentare il risultato


### 3) Organizzazione a matrice

Il Project Manager ha diretta autorità gerarchica solo sopra uno staff costituito da poche persone,

... che lo supportano nella pianificazione e nel controllo del progetto.

Il Project Manager è supportato da "gruppi di lavoro", costituiti da specialisti che rimangono gerarchicamente dipendenti dai responsabili funzionali dell'area di provenienza ...

Le risorse da utilizzare per la realizzazione del progetto sono allocate nelle aree funzionali e/o all'esterno dell'azienda

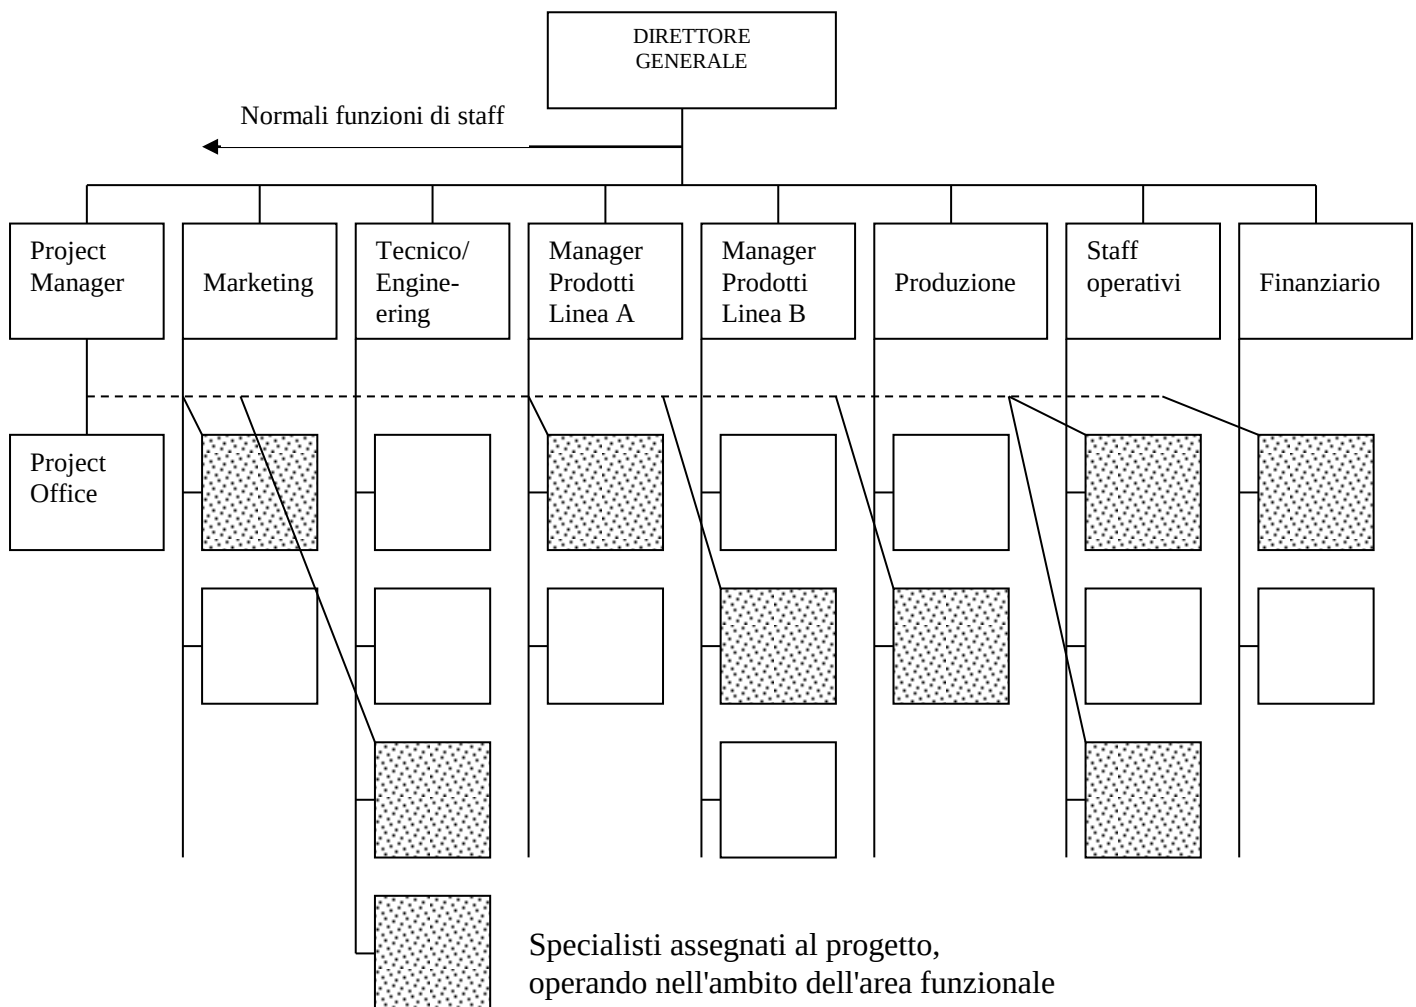

## Caratteristiche

- La struttura organizzativa a matrice è una combinazione delle due precedenti (centralizzata e funzionale), ma le risorse addette al progetto hanno un doppio legame di dipendenza
- Il personale addetto al progetto:
- Risponde al project manager per:
  - ♦ Esigenze di risorse, addestramento, controllo dei risultati
  - ♦ Definizione ed assegnazione dei compiti
  - ♦ Conduzione tecnica generica
  - ♦ Pianificazione e budget
  - ♦ Normalizzazione dei supporti operativi
- Risponde al manager funzionale per:
  - ♦ Definizione delle specifiche specialistiche
  - ♦ Valutazioni di fattibilità e convenienza
  - ♦ Variazioni di priorità tra progetti diversi
  - ♦ Assegnazione/suddivisione del lavoro
  - ♦ Successo/insuccesso finale nella realizzazione degli obiettivi
